



Ministerie van Defensie

GrIT

Grensverleggende IT

8^e Voortgangsrapportage

2025-2

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting	2	2.7 Governance	16
1 Inleiding	5	2.8 Kwaliteitsmanagement	16
2 Voortgang	6	2.8.1 Quality Assurance (QA) door Gartner	16
2.1 Algemeen	6	2.8.2 Quality Control (QC)	17
2.2 Resultaten 2025 en vooruitblik	6	2.8.3 Verbetermanagement	17
2.2.1 Resultaten tweede helft 2025	6	2.9 Risicomanagement en –beheersing	18
2.2.2 Uitgevoerde release tweede helft 2025	9	2.9.1 Hoofdrisico's programma GrIT	18
2.2.3 Herstel- en verbeterplan Private Cloud Platform	9	2.10 Regie en invulling samenwerking	18
2.2.4 Vooruitblik release 5	10	2.11 Ontwikkelingen COMMIT/JIVC	19
2.3 Status blokken	11	2.12 Ontwikkelingen IT-infrastructuurpartner en onderaannemers	19
2.4 Macroplanning	13	2.13 Wet en regelgeving	19
2.5 Defensiecapaciteit	14	2.14 Communicatiemomenten tweede helft van 2025	19
2.6 Kosten	14		
2.6.1 Programmakosten	15		
2.6.2 Exploitatiekosten	15		
2.6.3 Budget	16		
2.6.4 Verplichtingen en kasuitgaven binnen scope GrIT	16		

Managementsamenvatting

Deze achtste voortgangsrapportage GrIT rapporteert over de periode van 1 juli 2025 tot en met 31 december 2025. Tijdens de rapportageperiode is het programma GrIT volgens de afgesproken prioriteiten, aanpak en sturing verder uitgevoerd. In deze periode is er één release opgeleverd.

Resultaten

De resultaten van release 4 in de 2e helft van 2025 zijn gemengd. De focus van het programma GrIT is het zo snel als mogelijk opleveren van concrete resultaten die ondersteunen in de gereedstelling voor en uitvoering van hoofdtak 1. Dit betreft de Modules Ontplood, de IT-infrastructuur die defensieonderdelen meenemen in het veld, de lucht en op zee. Hier zijn samen met de lijnorganisatie de volgende geplande resultaten gerealiseerd:

- Upgrade gerealiseerd van de Cisco Voice-over-IP telefonie functionaliteit en geïmplementeerd op de HGI Baseline 5.1; deze functionaliteit is beschikbaar op de Modules Ontplood.
- Integratie van de GrIT Modules Ontplood en de huidige HGI Baseline 5.1; deze is beschikbaar voor het hoogerubriceerde informatiedomein-klein (HGI-klein). Het laaggerubriceerde informatiedomein (LGI-shared) en HGI-groot zijn gepland voor 2026.
- Realisatie van voldoende productie- en leveringscapaciteit om binnen twee jaar 90% van de krijgsmacht te kunnen voorzien van nieuwe modules ontplood. Deze extra leveringscapaciteit is gerealiseerd.

In het realiseren van de vernieuwing van de statische IT-infrastructuur, de basis-IT voor Defensie in Nederland, hebben zich in de rapportageperiode tegenvallers voorgedaan. Dit is ook gemeld in het antwoord op de feitelijke vragen bij de 7^e voortgangsrapportage¹.

- Het opleveren van Mijlpaal 3 van het Private Cloud Platform is vertraagd. Belangrijke oorzaken hiervan zijn noodzakelijke technische aanvullingen en de complexiteit in de integratie van hardware, nieuwe GrIT-functionaliteit en bestaande Defensie-bouwblokken.
- De uitbreiding van het IT-Service Management voor het beheer van de IT-diensten (GrIT ServiceNow) is niet gestart, omdat een werkend Private Cloud Platform hiervoor randvoorwaardelijk is.
- Het migreren van applicaties, in meerdere migratiefasen is niet gestart, omdat een werkend Private Cloud Platform hiervoor randvoorwaardelijk is.
- De uitbreiding van het Protected Core Network is deels gerealiseerd. Het twin datacenter en vier ankerstations zijn aangesloten.

De vertraging van het Private Cloud Platform en afhankelijke blokken betekent met name dat de medewerkers van Defensie langer moeten wachten op de vernieuwde basis-IT.

¹ Kamerstuk 35728, nr. 24, d.d. 26 januari 2026

Herstel- en Verbeterplan

In reactie op het niet halen van mijlpaal 3 voor Private Cloud Platform heeft Defensie van de leverancier nakoming en een herstelplan geëist, om de betreffende mijlpaal alsnog zo snel mogelijk te realiseren. Ook aan de zijde van Defensie zijn verbetermaatregelen opgesteld om de Defensie-bijdrage hierin te versterken. Verder is het ontwerp van de leverancier voor het Private Cloud Platform technisch gevalideerd door de externe quality assurance partij, Gartner, met positieve uitkomst.

In januari heeft Defensie het herstelplan, na aanvullingen en in combinatie met het verbeterplan van Defensie, geaccepteerd. Defensie staat daarbij op het standpunt dat de vertraging niet tot meerkosten in de realisatie mag leiden.

De belangrijkste elementen van het herstel- en verbeterplan zijn:

- De IT infrapartner zet extra capaciteit in voor het leveren en integreren van het Private Cloud Platform, met een apart integratieteam om de goede werking van het geheel te garanderen;
- De IT infrapartner en Defensie werken in sprints, met naast de driewekelijkse sprint review ook een wekelijkse controle op resultaten en issues;
- Het programma, de IT infrapartner en de beheerorganisatie werken op basis van strakke procesafspraken samen, bijvoorbeeld voor changes, testen en accepteren.

De eerste resultaten na de start van het verbeterplan zijn positief: in januari en februari zijn onderdelen van het Private Cloud Platform conform planning opgeleverd.

Planning

De planning en de uitvoering van het programma GrIT omvat 3 pijlers. De eerste is bedoeld voor IT in operationele omstandigheden. De tweede pijler richt zich op IT voor JIVC, het IT-bedrijf van Defensie. De derde pijler legt zich toe op de IT voor alle gebruikers. De releases van GrIT spitsen zich toe op opleveringen ten behoeve van deze 3 pijlers.

Voor pijler 1, de modules ontplooid, staat release 5 in het teken van de uitvoering van vier proofs-of-concept, samen met de operationele commando's:

- het beproeven van de XS-module door de KMAR;
- het beproeven van GrIT-hardware door CSZK;
- het beproeven van de S-servermodule door CLRS (loopt door in het derde kwartaal);
- het beproeven van de M-servermodule door CLAS.

De resultaten van release 4 en het lopende restwerk betekenen dat release 5 voor pijler 2 en het statische domein, in het teken staat van het uitvoeren van het nog openstaande werk.

Dit omvat:

- Het gereed voor accreditatie opleveren van het Private Cloud Platform;
- Het opleveren van geautomatiseerde inspoel- en update-functionaliteit voor het Protected Core Network (PCN).

De vertraging van het Private Cloud Platform heeft consequenties voor de macroplanning. De exacte consequenties zijn nog niet uitgewerkt; wel is een eerste impactanalyse gemaakt. Omdat de ontplooiende IT uit pijler 1 technisch onafhankelijk is van het Private Cloud Platform, wijzigt de planning hiervoor niet.

Voor pijler 3, IT voor de eindgebruiker, geldt dat blokken zowel een statische als een

ontplooid oplossen moeten opleveren. De statische oplossingen zijn voor implementatie afhankelijk van een werkend Private Cloud Platform, waardoor deze met tenminste zes maanden vertragen.

Voor de totaalplanning van pijler 2, de IT voor JIVC, verschuift de in de macroplanning opgenomen mijlpaal voor het Private Cloud Platform. Vanwege de afhankelijkheden, schuiven ook de mijlpalen voor de blokken BR-018/19 en BR-021-024 (service management, security en toegang) met minimaal een half jaar op. De exacte effecten op de mijlpaal voor de migratie van de applicaties (BR-038-043) zijn nog in onderzoek. Dit omdat er maatregelen zijn geïdentificeerd die de doorlooptijd van deze blokken kunnen verkorten.

In de volgende VGR wordt een aangepaste macroplanning opgenomen.

Kostenontwikkeling

De totale kosten van het programma GrIT zijn ten opzichte van de zevende voortgangsrapportage per saldo met € 42,6 miljoen gestegen.

Deze toename betreft hoofdzakelijk kosten voor het langer beheren en actueel houden van de huidige IT (€51,0 miljoen), zowel vanwege benodigde vervangingsinvesteringen als vanwege verlengde capaciteitsinzet. Deze stijging wordt deels gecompenseerd door lagere kosten op andere posten. Een groot deel van deze meerkosten (€27,3 miljoen) wordt gefinancierd uit de reguliere defensiebegroting en heeft geen betrekking op de realisatie van GrIT.

In de vertrouwelijke bijlage wordt dieper ingegaan op de individuele kostenposten.

Governance en samenwerking

De opzet van de sturing op het programma binnen Defensie (de programma-governance) is ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage ongewijzigd. Wel is de bemensing op cruciale posities binnen het programma gewijzigd en is de verantwoordelijkheid van de pijler-executives binnen het programma geëxpliciteerd.

Kwaliteit en risicobeheersing

Gartner en TNO hebben de afgelopen periode een bijdrage geleverd aan de Quality Assurance (QA) en risicobeheersing van het programma.

Gartner geeft aan dat de kwaliteitsappreciatie voor GrIT over de tweede helft van 2025 een gemengd beeld laat zien. Positief is dat de programmaleiding meer langetermijnsturing toont, onder meer door tijdig te starten met de voorbereiding van toekomstige releases (6 en 7). Dit zorgt voor beter inzicht in de verwachte opleveringen richting 2026 en 2027, en stelt Defensie, de IT-infrastructuurpartner en de ontvangende partijen in staat zich adequater voor te bereiden.

Wel deelt Gartner de zorg over de oplevering van het Private Cloud Platform. Dit is een “blocking issue” voor de essentiële migraties van de Keep Applicaties (MKA). Door Gartner gesignaleerde beheersmaatregelen voor het versnellen van de oplevering van het Private Cloud Platform, het versterken van architecturale sturing en het verbeteren van scope- en planningsprocessen zijn onderdeel van het verbeterplan.

1 Inleiding

Voor u ligt de achtste voortgangsrapportage van het programma Grensverleggende IT (GrIT) over de periode van 1 juli 2025 tot en met 31 december 2025. Het programma GrIT is door de Tweede Kamer aangewezen als groot project² middels de uitgangspuntennotitie. Dat betekent dat er conform de 'Regeling Grote Projecten' wordt gerapporteerd³.

Deze voortgangsrapportage geeft de stand van zaken weer over de rapportageperiode en de wijzigingen ten opzichte van de zevende voortgangsrapportage GrIT (2025-1). De opzet van deze rapportage volgt op hoofdlijnen de opzet van hoofdstuk 5 in de basisrapportage en de lijn van de eerdere voortgangsrapportages.

De ADR voert een jaarlijks onderzoek uit en rapporteert over de betrouwbaarheid van deze voortgangsrapportages en de financiën van GrIT. Het rapport van de ADR is openbaar.

² Kamerstuk 35 728, nr. 1 d.d. 11 februari 2021

³ De uitgangspuntennotitie vormt, met de Regeling Grote Projecten, de leidraad voor de tweejaarlijkse voortgangsrapportages.

2 Voortgang

2.1 Algemeen

Gedurende de rapportageperiode is de realisatie van de in opdracht gegeven blokken voortgezet op basis van de vastgestelde prioriteit. Sinds 2024 werkt GrIT met een releasematige werkwijze, waarbij de resultaten direct waarde toevoegen voor Defensie. De tweede helft van 2025 was de realisatie gericht op het opleveren van Release 4 voor zowel de ontplooiide operationele – als de statische omgeving.

In de komende paragrafen wordt de voortgang en status van het programma uiteengezet langs de volgende onderwerpen:

- Resultaten tweede helft 2025 en vooruitblik release 5
- Status blokken
- Defensiecapaciteit
- Kosten
- Governance
- Kwaliteitsmanagement
- Risicomanagement en -beheersing
- Regie en invulling samenwerking
- Ontwikkelingen COMMIT/JIVC
- Ontwikkelingen IT-infrastructuurpartner en onderaannemers
- Wet en regelgeving
- Communicatiemomenten tweede helft van 2025

2.2 Resultaten 2025 en vooruitblik

2.2.1 Resultaten tweede helft 2025

De resultaten van release 4 in de tweede helft van 2025 zijn gemengd. De focus van het programma GrIT is het zo snel als mogelijk opleveren van concrete resultaten die hoofdtak 1 ondersteunen. Dit betreft de Modules Ontplood, de IT-infrastructuur die defensieonderdelen meenemen het veld in (pijler 1). Hier zijn de meeste mijlpalen conform planning opgeleverd. De resultaten op de statische IT-infrastructuur zijn echter niet conform planning. Het geplande opleveren van het Private Cloud Platform is niet gerealiseerd, terwijl dit een randvoorwaarde is voor het realiseren van een aantal andere mijlpalen. Dit wordt in de hier opvolgende alinea's per pijler uiteengezet.

Pijler 1 - ontplooiide operationele IT voor de Operationele Commando's

In pijler 1 wordt de IT-infrastructuur gerealiseerd die voor het ontplooiid operationeel optreden van de OpCo's noodzakelijk zijn. Concreet gaat het om modules die gezamenlijk een 'mobiel datacenter' vormen. Hierbij ligt de focus op het optreden in het kader van Hoofdtak 1.

De opgave van deze pijler is om het evenwicht te vinden tussen de functionele behoefte en de beperkte ruimte die daarvoor beschikbaar is. Gezocht wordt naar een oplossing met voldoende functionaliteit, met software die dat mogelijk maakt, passend bij de hardware-configuratie, in een behuizing die het gebruik in operatie aankan. In 2025 zijn stappen gezet in het realiseren van de hardware en behuizing van de modules. Er wordt conform planning gewerkt aan het opleveren van geteste en geaccrediteerde modules voor de OpCo's.

In de rapportageperiode zijn de volgende resultaten behaald:

- De assemblage van acht varianten prototypes zijn uitgevoerd;
- Er is aanvullende facilitaire ruimte verkregen voor de assemblagelijijn;
- De eerste serie modules zijn geassembleerd en getest conform het technisch ontwerp;
- De eisen aan de behuizing van de modules zijn verder uitgewerkt met de OpCo's;
- De eerste beproevingen van de definitieve operationele behuizing hebben plaatsgevonden, onder andere met val-, tril- en stoftesten bij Thales.

Op basis van de verduidelijking van de eisen en de resultaten van de beproevingen worden de behuizingen verder verbeterd.

Daarnaast is, als tussenstap en om de uiteindelijke implementatie te versterken, gewerkt aan het plannen, organiseren en uitvoeren van vier Proof-of-Concepts (PoC's):

- *Beproeving met XS-modules (voor lokale opslag)*
De voorbereiding hiervoor is in 2025 afgerond. In januari is de PoC van de XS-module gestart met een LGI-versie voor de KMAR.
- *Beproeving Zr.Ms. Vlissingen (tbv commandopost/HQ tot 1500 man)*
De voorbereiding hiervoor is in 2025 grotendeels afgerond. Het inbouwen van de GrIT-oplossingen in de Zr.Ms. Vlissingen is tijdig gerealiseerd voor de eerste afvaart.
- *Beproeving met CLAS van een M-module (t.b.v. commandopost tot 500 man)*
De hardware-configuratie van de S-box is opgeleverd. Uitvoering van de PoC wordt verder uitgewerkt met CLRS. Doel is de PoC te starten in het tweede kwartaal 2026; deze zal doorlopen in het derde kwartaal.
- *Beproeving met CLAS van een M-module (t.b.v. commandopost tot 500 man)*
De hardware-configuratie van de M-box is opgeleverd; deze wordt met behuizing getest. Uitvoering van de PoC wordt verder uitgewerkt met CLAS. Doel is de PoC te starten in het tweede kwartaal 2026.

Deze PoC's helpen het programma om sneller *fit-for-purpose* modules te kunnen opleveren en helpen de OpCo's om kennis te maken met de nieuwe IT, als voorbereiding op de implementatie.

Pijler 2 - IT voor JIVC, ten behoeve van IT-dienstverlening aan de defensieonderdelen:

Binnen Pijler 2 wordt de IT-infrastructuur gerealiseerd die JIVC in staat stelt de IT-dienstverlening aan Defensie te vernieuwen. De oplevering van het Private Cloud Platform is hiervoor een cruciaal fundament. Hoewel meerdere technische componenten aantoonbaar geautomatiseerd kunnen worden afgeroepen, is het beoogde resultaat voor 2025 niet behaald. Oorzaak ligt in de forse vertraging van het opleveren van de acceptatie- en productieomgevingen van het Private Cloud Platform. Dit heeft consequenties voor andere onderdelen van het GrIT programma (zie par. 2.4).

Wel zijn er kleinere deelresultaten behaald:

- De ontwikkel- en testomgevingen van het Private Cloud Platform zijn met een steunmaatregel vanuit de huidige IT gereed voor koppeling naar het Security Operations Center van Defensie;
- Op de acceptatie-omgeving is de basisinfrastructuur gereed. De basisdiensten-laag en de security-monitoring-laag zijn beide voor 50% gereed;
- Bij de bouw van het uitwijk-datacenter (blok BR-026) is een bouwmijlpaal behaald: het datacenter is wind en waterdicht;
- Het uitvoeringsplan voor de blokken applicatiemigratie (BR-038-043) is vastgesteld, daarmee is mijlpaal 1 behaald. De start van de realisatie is uitgesteld tot het Private Cloud Platform beschikbaar is;
- De federatieve koppeling met de NAVO is technisch gereed;
- De Beveiligingsautoriteit van Defensie heeft een tijdelijke toestemming verleend voor de doorontwikkeling van het Private Cloud Platform (tot 30 juni 2026), in afwachting van formele accreditatie.

Daarnaast zijn voorbereidende werkzaamheden voor het IT service management en –beheer en de applicatiemigratie uitgevoerd.

Pijler 3 - IT voor alle eindgebruikers:

In pijler 3 worden functionaliteiten voor elke defensie-medewerker gerealiseerd. In 2025 is gewerkt aan blok BR-002, communicatie via spraak, video en chat. Om de technische gereedheid van Defensie in het kader van Hoofdtak 1 te kunnen ondersteunen, is dit blok in twee sporen uitgewerkt.

- *Spoor 1 – langere termijn: greenfield oplossing*
In dit spoor wordt een toekomstbestendig, robuust fundament voor communicatie ontwikkeld. Hiermee kan Defensie vanaf de basis de meest moderne en geïntegreerde communicatie-oplossingen implementeren. In de tweede helft van 2026 staat een eerste pilot met gebruikers op de digitale werkplek gepland.
- *Spoor 2: korte termijn: lifecycle voor ontplooid*
- Parallel is de bestaande communicatie-omgeving doorontwikkeld. Hierbij zijn de meest noodzakelijke verbeteringen en functionaliteiten (voice, video, videoconferentie & chat) opgeleverd. De nieuwe versie van de callmanager is opgenomen in de baseline voor het ontplooi domein en de hardware is beschikbaar. In de eerste helft van 2026 wordt de versie verder verbeterd. Hiermee wordt de gereedstelling voor Hoofdtak 1 direct ondersteund.

En verder:

- Het Implementatieplan Cell-on-Wheels, een mobiele GSM-oplossing, is in uitwerking.
- Voor het Defensie Mobiel Netwerk (blok BR-001) is het advies van Bell Labs beschikbaar voor besluitvorming in het tweede kwartaal van 2026. Op basis daarvan kan een keuze gemaakt worden over de exacte uitvoeringsvorm van dit blok.

2.2.2 Uitgevoerde release tweede helft 2025

In de tweede helft van 2025 heeft het programma GrIT zijn vierde release opgeleverd. De resultaten van release 4 geven een gemengd beeld. Naast goede voortgang op het gebied van de ontplooiende modules, bleven door noodzakelijke technische aanvullingen en complexiteit in de integratie van hardware, nieuwe GrIT-functionaliteit en bestaande Defensie-bouwblokken de resultaten op het statische domein achter. Concreet waren de geplande resultaten van release 4:

- Het opleveren van Mijlpaal 3 van het Private Cloud Platform met steunmaatregelen van andere blokken, waarmee eindgebruikers geautomatiseerde Private Clouddiensten kunnen aanvragen; *Is niet opgeleverd binnen de tijdslijn van release 4.*
- Een uitbreiding van het IT-Service Management dat helpt met het beheer van de IT-diensten (GrIT ServiceNow); *Is niet opgeleverd binnen deze release, door afhankelijkheid van het Private Cloud Platform.*
- Het verder uitbreiden van het Protected Core Network (PCN), onder andere naar het Caribisch gebied; *PCN-functionaliteit, met een tijdelijke workaround voor PCN automation, is geschikt voor HGI BL5.1 inzet bij landgebonden optreden. Het 1GNC heeft geoefend met drie geleverde PCN-aansluitboxen. Het Twin Datacenter en vier satelliet ankerstations zijn aangesloten, onder andere in het Caribisch gebied. Daadwerkelijke automatisering PCN vindt plaats in release 5. Oplevering PCN op schepen wordt onderdeel van release 6.*
- Het in het derde kwartaal migreren van applicaties in meerdere migratiefases; *Is niet opgeleverd binnen deze release, door afhankelijkheid van het Private Cloud Platform.*
- Het upgraden van de Cisco Voice-over-IP telefonie functionaliteit op de bestaande ontplooiende IT. Na afronding is er een nieuwe versie van de Cisco CallManager (v14) opgeleverd en geïmplementeerd op de HGI Baseline 5.1; deze functionaliteit is ook beschikbaar op de Modules Ontplooid. *Volledig opgeleverd.*
- Integratie van de huidige HGI Baseline 5.1 met de GrIT Modules Ontplooid; *HGI klein is beschikbaar voor HGI Baseline 5.1. HGI Groot en LGI shared zijn niet binnen deze release opgeleverd, deze volgen in 2026. Modules Ontplooid zijn geïntegreerd in HGI BL5.1, geschikt voor beproevingen.*
- Opvoeren van de productiecapaciteit om, vanaf juli 2025, binnen twee jaar 90% van de krijgsmacht te voorzien van nieuwe modules ontplooid. *Opgeleverd conform scope (2x15 sets). Aanvullende hardware, nodig voor beproevingen, is grotendeels in 2025 geleverd.*

2.2.3 Herstel- en verbeterplan Private Cloud Platform

In reactie op het niet halen van mijlpaal 3 voor het Private Cloud Platform heeft Defensie van de leverancier nakoming en een herstelplan geëist. Ook aan de zijde van Defensie zijn verbetermaatregelen opgesteld. Verder heeft Defensie twee onderzoeken laten doen. Het Private Cloud Platform is technisch gevalideerd door Gartner, die concludeerde dat het ontwerp, de gekozen softwareproducten en de voorgestelde oplossing technisch solide zijn. PWC heeft het herstelplan van de IT-infrastructuurpartner inhoudelijk positief beoordeeld, met de aanbeveling om de borging te versterken. In januari heeft Defensie een verbeterplan, met daarin de maatregelen van de IT-infrastructuurpartner en Defensie, geaccepteerd. Defensie staat daarbij op het standpunt dat de vertraging niet tot meerkosten in de realisatie kan leiden.

De belangrijkste maatregelen in het herstel- en verbeterplan zijn:

- De IT infrapartner zet extra capaciteit in voor het leveren en integreren van het Private Cloud Platform, inclusief een apart integratieteam en verzwaarde sturing vanuit de architectuur om goede werking van het geheel te garanderen.
- De voortbrenging wordt georganiseerd in driewekelijkse sprints. Naast de sprint review is er een wekelijkse closing Friday met verantwoordelijk projectleiders om resultaten te delen en issues vroegtijdig aan te pakken.
- Voor deelprocessen waarbij samenwerking tussen programma, IT-infrastructuurpartner en beheerorganisatie nodig is, worden strakke procesafspraken gemaakt. Dit gaat om:
 - Het doorvoeren van changes voor koppelingen met huidige IT;
 - Het vaststellen van technische ontwerpen;
 - Het testen en accepteren van de opgeleverde producten.
- Opgeleverde producten worden op beheerbaarheid gevalideerd door een externe partij.

De maatregelen zijn een stap verder op de ingeslagen richting. Zo zijn de afspraken over changes tussen Defensie en de IT-infrastructuurpartner geconcretiseerd in een forecast (welke changes komen er aan) en een service level agreement (hoeveel tijd kost welk type change). Na de escalatie, in de eerste maanden van 2026, zijn de eerste onderdelen van het Private Cloud Platform - denk aan patch- en updatebeheer, netwerkbeveiliging en geautomatiseerd wijzigingenbeheer - conform de planning uit het herstelplan opgeleverd.

2.2.4 Vooruitblik release 5

De resultaten van release 4 en het restwerk uit eerdere releases betekenen dat release 5 voor het statische domein primair in het teken staat van het uitvoeren van het nog openstaande werk uit de eerdere releases. Voor het ontplooid domein wordt gewerkt aan proofs-of-concept. Daarmee omvat release 5:

- Het realiseren van vier proofs-of-concept van de Modules Ontplooid (pijler 1), samen met de operationele commando's:
 - het beproeven van de XS-module in een auto van de KMAR; deze beproeving is gestart.
 - het beproeven van GrIT-modules door CSZK in het nieuwe MCM-vaartuig, de Vlissingen, van CZSK. Het schip is eind februari in Den Helder aangekomen. In een periode van een maand zijn de modules zijn ingebouwd en getest. De PoC loopt op planning.
 - het beproeven van de S-module door CLRS. Op basis van de hardware-configuratie wordt gewerkt aan een beproevingsplan, samen met CLRS.
 - het beproeven van de M-module door CLAS. Op basis van de hardware-configuratie wordt gewerkt aan een beproevingsplan, samen met CLAS.
- Het gereed voor accreditatie opleveren van het Private Cloud Platform (pijler 2). Dit vergt de technische realisatie van de acceptatie- en productieomgeving, alsook het testen van deze omgevingen en de acceptatie door de beheerorganisatie. De accreditatie van het Private Cloud Platform kan starten zodra de documentatie, van technisch ontwerp tot testrapport, volledig is opgeleverd.
- De functionaliteit van de Protected Core Netwerk Acces Box wordt uitgebreid. Zo kan deze volledig geautomatiseerd ingespoeld worden met de HGI Baseline 5.1 en kunnen opgeslagen PAB boxen, mits aangesloten op het netwerk, constant voorzien worden van de laatste software-updates.

2.3 Status blokken

De realisatie van de GrIT-blokken vormt de basis voor het releasematig opleveren van functionaliteiten. In deze paragraaf wordt ingegaan op de status van deze blokken.

De status van de blokken is in deze rapportageperiode onveranderd. Van de 43 blokken zijn tot nu toe twee blokken (Operationele Compartimenten (BR-028) en het Twin datacenter (BR-025)) in beheer gegeven. Op 31 december 2025 bevinden zich zestien blokken in realisatie- en acht blokken in de initiatiefase. Eén blok is gestopt. Van de overige blokken zijn elf blokken nog niet gestart en worden vijf blokken buiten het programma door Defensie uitgevoerd.

Figuur 01: **status blokken**

De belangrijkste wijzigingen in de realisatie- en initiatiefase worden hieronder toegelicht.

Pijler 1 Ontplooide IT voor OpCo's	Pijler 2 IT voor JIVC-dienstverlening aan DO'n	Pijler 3 IT voor alle eindgebruikers
BR-028: Operationele Compartimenten T	BR-014-017: Private Cloud Platform R	BR-001: Defensie Mobiele Netwerk ¹ R
BR-029: Modules Ontplood R	BR-018: IT Service Management R	BR-002: Unified Communications ¹ R
BR-036: MKA HGI R	BR-019: IT Operational Management R	BR-003: Contact Center N
BR-037: MKA Ontplood R	BR-021: Security Operations Center I	BR-004: Operational Chat I
	BR-022: Identity Access Management R	BR-005: Critical Communications I
	BR-023: Info. Exchange Gateway R	BR-006: End-User Devices N
	BR-024a: IT-Toegangscontrole R	BR-007: Individual Workspace N
	BR-024b: Data at rest R	BR-008: IT-Basistoepassingen N
	BR-024c: Labelling I	BR-009: Collab. & Comms. services N
	BR-025: Twin Data Center T	BR-012: Internet op de Legering (IODL) *
	BR-010: Protected Core Network R	BR-013: Welfare *
	BR-038-043: MKA LGI I	BR-030-033: Generieke Services N
	BR-026: Uitwijk Data Center R	
	BR-011: Local Area Network N	
	BR-020: Yellow Domain N	

¹ De scope wordt heroverwogen als onderdeel van de herijking aanpak GrIT

Legenda

N Nog te starten	I Initiatiefase	R Realisatiefase
T Ter beschikkingstellingsfase (exploitatie)	* Buiten programma door Defensie uitgevoerd	

Realisatiefase

7 blokken zitten in de realisatiefase conform de afgesproken scope.

In februari 2025 zijn de werkzaamheden voor het Defensie Mobiel Netwerk (blok BR-001) stopgezet. BellLabs heeft een nieuwe business case en haalbaarheidsstudie uitgevoerd, om te bepalen op welke wijze uitvoering van dit blok realistisch en effectief kan worden uitgevoerd. Een besluit hierover wordt in het tweede kwartaal van 2026 genomen.

Vanwege beperkte voortgang op het Identity & Access Management (blok BR-022) is in februari 2025 een ingebrekestelling aan de leverancier gestuurd. Op basis van een herstelplan van de leverancier, heeft Defensie groen licht gegeven voor de verdere realisatie van dit blok.

Voor de blokken migratie KEEP-applicaties (BR-038-043) is het oUP/DAP geaccepteerd, waarmee mijlpaal 1 is gehaald. In deze blokken worden alle applicaties met een KEEP-besluit in verschillende fasen op de nieuwe IT beschikbaar gemaakt. De opdracht voor de realisatiefase is uitgesteld tot oplevering van het Private Cloud Platform. Wel zijn de voorbereidingen voor de eerste drie fasen van de applicatiemigratie vergevorderd: zodra applicaties kunnen landen op het Private Cloud Platform, kan de migratie starten.

Initiatiefase


De IT toegangscontrole (Blok BR-024) wordt in drie delen uitgevoerd. De delen BR-024A en BR-024B zijn in realisatie. Het uitvoeringsplan van BR-024C (Labeling) wordt herzien in verband met andere productkeuzes. De besluitvorming over product, doorlooptijd en benodigd budget wordt in het tweede kwartaal van 2026 verwacht.

Voor de overige zeven blokken worden de planningsdocumenten en het geactualiseerde technisch ontwerp opgesteld om daarmee, na vaststelling van de documenten, de blokken in realisatie te kunnen laten gaan.

2.4 Macroplanning

In onderstaande figuur is de vastgestelde macroplanning van het programma GrIT weergegeven.

Figuur 02: Vastgestelde Macroplanning 2024

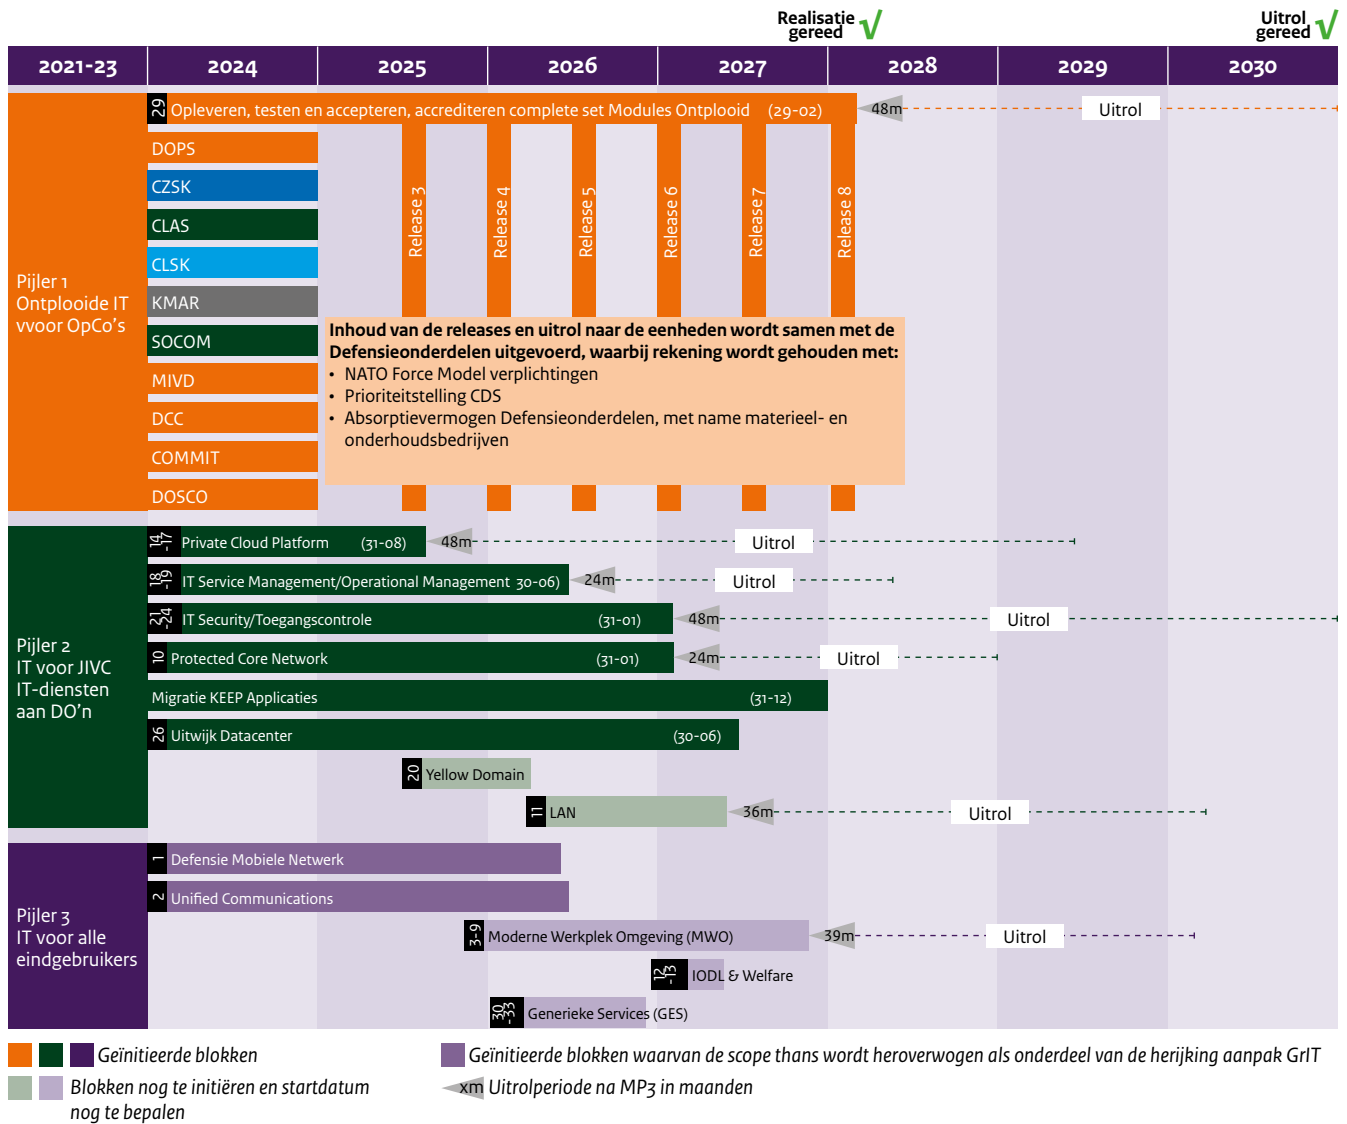

De vertraging van het Private Cloud Platform heeft consequenties voor de macroplanning. De exacte consequenties voor de planning, inclusief onderliggende risico's en buffers, zijn op dit moment nog niet volledig vast te stellen. Wel is een eerste impactanalyse uitgevoerd.

- Voor de ontplooiende IT uit pijler 1 is er geen impact. De ontplooiende modules zijn technisch onafhankelijk van het Private Cloud Platform. Met de IT-infrastructuurpartner is bovendien afgesproken dat de vertraging geen effect mag hebben op de afgesproken mijlpalen voor deze pijler.
- Voor pijler 2 heeft de vertraging uiteraard impact. De in de macroplanning opgenomen mijlpaal voor Private Cloud Platform verschuift. Na de technische oplevering in de komende release, volgen de accreditatie en inbeheername. Daarmee verschuiven ook de mijlpalen van blokken die op dit Private Cloud Platform moeten landen, zoals service management, security en toegang. Dit raakt mijlpalen voor de blokken BR-018/19 en BR-021-024; deze vertragen met tenminste een half jaar.
Het exacte effect op de mijlpaal voor de migratie van de applicaties (BR-038-043) is nog in onderzoek. Er zijn maatregelen identificeerd die de doorlooptijd van deze blokken kunnen verkorten.
- Voor pijler 3 geldt dat op dit moment alleen blok Unified Communications (BR-002) in realisatie is. Deze functionaliteit moet voor het statische domein landen op het Private Cloud Platform, en vertraagt daarmee ook met tenminste 6 maanden.

Vooralsnog is het nog te vroeg om te concluderen dat de vertraging van het Private Cloud Platform effecten heeft op de eindmijlpaal van het programma. In de volgende VGR wordt een aangepaste macroplanning opgenomen.

2.5 Defensiecapaciteit

In de tweede helft van 2025 waren er geen significante knelpunten bij het toewijzen van de benodigde GrIT capaciteit. Eerder opspelende verdringing is door het toepassen van mitigerende maatregelen beheersbaar en opgelost. Ook in het tweede half jaar van 2025 was de beschikbaarheid van de zogeheten HGI-capaciteit een punt van aandacht. Middels intensief overleg tussen de betreffende afdeling en de projectleiders van de blokken is een optimale inzet van de resources bereikt. Hetzelfde geldt voor de inzet voor blok BR-021 'Security'.

Vooruitkijkend naar 2026 is vanuit het programma de capaciteitsbehoefte grofweg aangegeven voor het hele kalenderjaar, waarbij in overleg met de afdelingen per kwartaal de capaciteit definitief wordt geborgd. De benodigde capaciteit wordt per kwartaal herijkt, aangepast op de actuele stand van zaken (bijv. door wijzigingen in de planning of onvoorziene omstandigheden), zodat JIVC de (schaarse) capaciteit optimaal kan inzetten voor alle programma's en projecten met prioriteit.

2.6 Kosten

Conform de Regeling Grote Projecten en de uitgangspuntennotitie wordt in de voortgangsrapportage GrIT gerapporteerd over de begroting van het programma GrIT. Dit zijn de posten investeringen, risicoreservering op deze investeringen en de exploitatie van de nieuwe IT en de instandhoudingskosten van de huidige IT binnen JIVC.

De totale kosten van het programma GrIT zijn ten opzichte van de zevende voortgangsrapportage per saldo met € 42,6 miljoen gestegen. De programmakosten zijn per

saldo met €18,9 miljoen gestegen. Deze toename is name te verklaren door het langer actueel houden van huidige IT, onder andere door een stijging van de life cycle costs, de benodigde vervangingsinvesteringen in de huidige IT. Deze meerkosten worden gefinancierd uit de reguliere defensiebegroting.

De exploitatiekosten zijn per saldo met €23,7 miljoen gestegen. Dit betreft onder meer een stijging van de kosten voor de capaciteit van het beheer van de huidige IT. Ook hiervoor ligt de oorzaak in de actualisatie van de planning, die maakt dat de huidige IT langer operationeel moet worden gehouden.

2.6.1 Programmakosten

De programmakosten inclusief risicoreservering zijn per saldo met € 18,9 miljoen gestegen. Dit is als volgt te verklaren:

- **Realisatie GrIT (€13,0 miljoen):** De geplande kosten voor realisatie van het programma zijn door meerkosten in de bouw van blokken (o.a. uitwijkdatacenter en PCN) per saldo met €13 miljoen gestegen als gevolg van verzoeken tot wijzigingen (VTW's). Deze meerkosten worden volledig gecompenseerd door inzet van de risicoreservering.
- **Transitiemanagement (€ 17,4 miljoen):** De geplande kosten voor transitiemanagement stijgen door extra lifecycle-management en noodzakelijke uitbreidingen van bestaande IT (€11 miljoen), verloopkosten (€4,3 miljoen) en meerwerk in het voorbereiden van applicaties op migratie naar de nieuwe IT (€2,2 miljoen).
- **Inzet Defensie in gemeente teams (€ -/- 1,5 miljoen):** Er heeft een neerwaartse correctie plaatsgevonden op loonsom door een herberekening.
- **Overige investeringen (€ 2,3 miljoen):** De geplande kosten zijn met € 2,3 miljoen toegenomen als gevolg van door Defensie aangeschafte crypto hardware, deze kosten worden volledig gecompenseerd door inzet van de risicoreservering.
- **Risicoreservering (-/- € 12,4 miljoen):** De stand van de beoogde risicoreservering daalt, met € 12,4 miljoen ter financiering van wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de tweede helft van 2025.

In de vertrouwelijke bijlage wordt dieper ingegaan op de individuele kostenposten.

2.6.2 Exploitatiekosten

De geplande exploitatiekosten zijn per saldo met € 23,7 miljoen gestegen. Deze post bestaat uit een stijging van € 33,6 miljoen binnen de exploitatie van de huidige IT en uit een daling van € -/-9,9 miljoen binnen de exploitatie van de nieuwe IT.

De hogere kosten voor het beheer van de huidige IT zijn voornamelijk het gevolg van de actualisatie van de planning (huidige IT draait langer door).

De meerkosten voor het beheer van de nieuwe IT worden verklaard door:

- aanloopkosten afdeling ICS in de tweede helft van 2025 (€ 9,9 miljoen). In de oorspronkelijke business case was geen rekening gehouden met het opstarten van het beheer van de nieuwe IT en het inrichten van de nieuwe organisatie;
- wijzigingen in de exploitatie die buiten het programma zijn gefinancierd. Dit veroorzaakt een toename van de geplande kosten van €15,1 miljoen;
- door vertraging in GrIT en het daardoor later uitrollen van nieuwe IT, dalen de beheerlasten per saldo met €34,9 miljoen.

In de bijlage bij dit document en in vertrouwelijke bijlage wordt dieper ingegaan op de individuele kostenposten.

2.6.3 Budget

Tegenover de stijging van de kosten staat dat ook het budget door aanvullende dekking en indexering is gestegen met € 42,6 miljoen naar circa € 3.883,7 miljoen. In onderstaand overzicht zijn de eerdergenoemde stijgingen in kosten en stijging van het budget schematisch weergegeven.

Tabel 1: **Ontwikkeling totaalbudget GrIT**

Omschrijving	Bedrag (x € miljoen)
Totaalbudget GrIT conform vorige voortgangsrapportage (30-06-2025)	€ 3.841,1
Toename budget	€ 42,6
Totaalbudget GrIT per 31-12-2025	€ 3.883,7

2.6.4 Verplichtingen en kasuitgaven binnen scope GrIT

DeelFasen	Openstaand per 31-12-2024	Aangegaan in 2025	Betaald in 2025	Openstaand per 31-12-2025
Grensverleggende IT - Realisatiefase	161,8	95,3	76,7	180,5
Terbeschikkingstellingsfase	187,9	175,9	174,8	236,1
Totaal	384,8	283,2	251,5	416,5

Binnen het programma GrIT is in 2025 in totaal € 243,2 miljoen betaald. Hiervan is € 78,0 miljoen uitgegeven aan de activiteiten die zijn uitgevoerd in de realisatiefase. Voor de terbeschikkingstellingsfase is gedurende 2025 in totaal € 165,2 miljoen betaald.

2.7 Governance

De opzet van de sturing op het programma binnen Defensie (de programma-governance) is ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage over het programma GrIT ongewijzigd. Wel is de bemensing op cruciale posities binnen het programma gewijzigd, waaronder die van programmadirecteur. Ook is de verantwoordelijkheid van de pijler-executives binnen het programma geëxpliciteerd, voor een meer eenduidige sturing op de IT-infrastructuurpartner.

2.8 Kwaliteitsmanagement

2.8.1 Quality Assurance (QA) door Gartner

Gartner en TNO hebben de afgelopen periode een bijdrage geleverd aan de Quality Assurance (QA) en risicobeheersing van het programma.

Gartner geeft aan dat de kwaliteitsappreciatie voor GrIT over de tweede helft van 2025 een gemengd beeld laat zien. Positief is dat de programmaleiding meer langetermijnsturing toont, onder meer door tijdig te starten met de voorbereiding van toekomstige releases (6 en 7). Dit zorgt voor beter inzicht in de verwachte opleveringen richting 2026 en 2027, en stelt Defensie, de IT-infrastructuurpartner en de ontvangende partijen in staat zich adequater voor te bereiden.

Wel deelt Gartner de zorg over de oplevering van het Private Cloud Platform. Dit is een “blocking issue” voor de essentiële migraties van de Keep Applicaties. Door Gartner gesignaleerde beheersmaatregelen voor het versnellen van de oplevering, het versterken van architecturale sturing en het verbeteren van scope- en planningsprocessen zijn onderdeel van het verbeterplan.

2.8.2 Quality Control (QC)

In de verslagperiode heeft de IT-infrastructuurpartner geen contractdocumentatie aangeleverd met betrekking tot de gecontracteerde (IT-)blokken (w.o. oUP, oUP-TBS). De werkzaamheden voor GrIT-blokken zijn verschoven naar verschillende Releases; er zijn geen nieuwe blokken gestart. In dat kader is Releaseplan 4 getoetst. Releaseplan 4 is met de CIO-office doorgesproken (over de inhoudelijke invulling), maar niet voorgelegd voor advies.

Verder zijn reviews uitgevoerd op basis van specifieke vragen:

- Test- en acceptatieproces en (betrouwbaarheid van) planningen. QC heeft vastgesteld dat de huidige opzet van het test- en acceptatieproces enerzijds en de beschikbaarheid van betrouwbare planningen anderzijds essentiële tekortkomingen vertonen in voorbereiding, uitvoering en borging. Dat heeft geleid tot verbetervoorstellen om opleveringen tijdig en conform de afgesproken kwaliteit op te leveren. Recent follow-up onderzoek laat zien dat de verbetervoorstellen nog niet volledig zijn doorgevoerd. Deze zijn onderdeel gemaakt van het verbeterplan.
- Locatieonderzoek – assemblagestraat Modules Ontplooid. QC heeft een locatieonderzoek uitgevoerd naar het assemblageproces (configuratie modules) om vast te stellen of de inrichting en uitvoering voldoende betrouwbare waarborgen bieden. Aansluitend heeft QC toets/reviewkaders voor de Proof of Concepts (PoC) opgesteld.
- ISAE 3402 / toereikendheidsverklaring: In het GrIT-contract is opgenomen dat bij de opleverfase sprake moet zijn van een jaarlijkse verklaring over de opzet, het bestaan en de werking van de opgeleverde IT-producten en diensten. Op basis van een review van de status van de beoogde verklaring constateert QC dat de huidige opzet nog onvoldoende aansluit op de specifieke behoefte van Defensie.

2.8.3 Verbetermanagement

Met het verbetermanagement wordt de voortgang van geïntermediateerde of geadviseerde maatregelen gemonitord. QC constateert dat beperkte voortgang is geboekt in het implementeren c.q. afronden van verbeteracties.

In de vorige voortgangsrapportage (VGR 2025-1) stonden nog drie openstaande verbeteracties uit het Tussentijds CIO-oordeel (vierde kwartaal 2022) vermeldt. Er resteren nog een tweetal verbeterpunten die buiten de directe invloedssfeer van het programma GrIT liggen:

- Borg de beschikbaarheid van de specialistische professionals (JIVC).
- Maak een meerjarige personele planning voor JIVC en houd daarbij rekening met de grote programma's (JIVC).

Het verbeterpunt ‘Geef prioriteit aan het gereed maken voor migratie van applicaties’ is gesloten.

Tot slot zijn de belangrijkste CIO-adviezen in de periode sinds de start van GrIT, gericht op de algehele sturing en werking van het programma, doorgesproken met het CIO-office. Daarin is ook gesproken over het toezicht op Release 5.

2.9 Risicomanagement en –beheersing

Het risicomanagement voor het programma heeft wederom gebruik gemaakt van TNO om de laatste bijgestelde begroting (oktober) te valideren. Op basis van de inzichten is afgesproken deze actie jaarlijks te herhalen. De risico's die Gartner als QA opvoert, zijn geïntegreerd met door het programma zelf geïdentificeerde risico's. Ook is het risico-overleg met de IT-infrastructuurpartner gecontinueerd. Hierin wordt bekeken waar aan beide zijden risico's overlappen en of deze gezamenlijk gemitigeerd kunnen worden.

Het QC van GrIT concludeert dat het eigenaarschap van risicomanagement is toegenomen, mede door de komst van de nieuwe programmadirecteur en de integratie van Risicomanagement en Gezonde projectbeheersing (GPB), de projectbeheerssystematiek van JIVC.

2.9.1 Hoofdrisico's programma GrIT

In de voortgangsrapportage wordt ingegaan op de negen hoofdrisico's. Conform Integraal Risico Management Defensie wordt de waardering aangegeven in waarden variërend van zeer klein, klein, gemiddeld, groot tot zeer groot.

Zoals aangegeven in de lijst van vragen en antwoorden inzake Zevende voortgangsrapportage programma Grensverleggende IT (Kamerstuk 35728-23), worden de hoofdrisico's, inclusief kans en verwachte impact, opgenomen in de vertrouwelijke bijlage. In de afgelopen periode is de status van deze risico's over het algemeen verhoogd.

2.10 Regie en invulling samenwerking

In 2025 is de governance verder vereenvoudigd. Zowel contractueel als binnen het Programma GrIT ligt de focus nu op verantwoording vanuit één partij (Kyndryl als IT-Infrastructuurpartner). Tevens is er een eerste aanzet gedaan om, naast de Realisatieopdracht(en), ook de Dienstverlening (TBS) concreter onderdeel te maken van de contractuele governance. Dit met het oog op de toekomstige groei in omvang van beheerde diensten vanuit Programma GrIT. Dit komt de samenwerking tussen Defensie en de IT-Infrastructuurpartner ten goede en zorgt ook voor meer integrale sturing en verantwoording vanuit de IT-Infrastructuurpartner naar Defensie over de gehele contractuele dienstverlening.

De ingebrekestelling, op basis van de tekortkoming op BR-022 (Identity & Access Management), is in december 2025 ingetrokken door middel van het ondertekenen van een dechargeformulier. Het herstelplan van de IT-Infrastructuurpartner is naar tevredenheid van Defensie uitgevoerd.

In oktober moest worden geconstateerd dat voortgang uitbleef, dit keer op de toegezegde oplevering van het Private Cloud Platform. De IT-Infrastructuurpartner is hierop aangesproken en opgedragen een herstelplan op te stellen om alsnog te komen tot een betrouwbare oplevering. Dit plan is eind december 2025 formeel opgeleverd. Besluitvorming over het vervolg heeft plaatsgevonden in januari 2026. Onderdeel hiervan is een driewekelijks overleg tussen de PCDS en de internationale executive van Kyndryl, dat sinds oktober 2025 is ingericht. In dit overleg kunnen issues in de samenwerking op het hoogste niveau bespreekbaar worden gemaakt.

De vertraging van het Private Cloud Platform en het late melden daarvan heeft de samenwerking met de IT-infrastructuurpartner onder druk gezet. De reactie van Defensie was stevig; het komende half jaar is de lakmoesproef voor de verdere samenwerking.

2.11 Ontwikkelingen COMMIT/JIVC

In het tweede halfjaar van 2025 heeft de vertraging binnen GrIT impact gehad op de werkzaamheden van de huidige IT. Door de wijziging in de planning zijn er extra inspanningen geleverd om de beoogde taken binnen de huidige IT voort te zetten, bijv. de levenscyclus-beheersing (LC) van de geplande functionaliteiten en diensten. Het schuiven van de tijdlijnen belemmert de algehele voortgang van de gezamenlijke infrastructuur-initiatieven. Het vaststellen van een nieuwe planning zal de uitvoering van deze werkzaamheden bevorderen.

2.12 Ontwikkelingen IT-infrastructuurpartner en onderaannemers

De leverzekerheid van de IT-infrastructuurpartner is mede afhankelijk van ontwikkelingen bij de onderaannemers, waarbij Kyndryl als IT-infrastructuurpartner de verantwoordelijkheid draagt voor het mitigeren van risico's die een negatieve impact hebben op de realisatie van GrIT.

Binnen het samenwerkingsverband zijn diverse onderaannemers betrokken, waarvan Atos de belangrijkste is. Binnen de contractgovernance is het functioneren van onderaannemers een vast onderwerp van gesprek. Kyndryl wordt aangesproken op hun integrale verantwoordelijkheid en dat Defensie één IT-Infrastructuurpartner heeft gecontracteerd. Defensie wordt ook deelgenoot gemaakt dat dit door Kyndryl binnen het leveranciersverband (zowel de eigen organisatie als onderaannemers) onder de aandacht wordt gebracht.

Concreet waren er rond onderaannemers van de IT-infrastructuurpartner geen noemenswaardige ontwikkelingen te melden gedurende deze rapportageperiode. De situatie wordt continu gemonitord om eventuele risico's tijdig te identificeren en te mitigeren.

2.13 Wet en regelgeving

Geen bijzonderheden.

2.14 Communicatiemomenten tweede helft van 2025

- 17/12/2025: Inbreng feitelijke vragen GrIT (verzending antwoorden aan de Kamer per 26/01/2026)

Bijlage 1 Financiële verantwoording 2025 project Grensverleggende IT

Tabel 1: **Gerealiseerde ontvangsten (in miljoen €)**

	ontvangen t/m 2024	ontvangen in 2025	ontvangen t/m 2025
Royalty's	0,0	0,0	0,0
Overige ontvangsten	0,0	0,0	0,0
Totaal	0,0	0,0	0,0

Tabel 2: **Gerealiseerde betalingen (in miljoen €)**

Deelfasen	betaald t/m 2024	betaald in 2025	betaald t/m 2025
Voorafgaand programma PRIT	4,8	0,0	4,8
Grensverleggende IT - Realisatiefase	400,7	77,5	478,2
Terbeschikkingstellingsfase	126,8	174,8	301,6
Totaal	532,3	252,3	714,8

Tabel 3: **Aangegane en openstaande verplichtingen (in miljoen €)**

Deelfasen	Openstaand per 31-12-24	Aangegaan in 2025	Betaald in 2025	openstaand per 31-12-25
Grensverleggende IT - Realisatiefase	161,8	95,3	76,7	182,7
Terbeschikkingstellingsfase	223,0	187,9	174,8	233,7
Totaal	384,8	283,2	251,5	416,5

Tabel 4: **Openstaande voorschotten (in miljoen €)**

Deelfasen	openstaand per 31-12-24	nieuw in 2025	verrekend in 2025	openstaand per 31-12-25
Voorafgaand Programma PRIT	0,0	0,0	0,0	0,0
Grensverleggende IT - Realisatiefase	0,8	0,0	0,8	0,0
Terbeschikkingstellingsfase	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	0,8	0,0	0,8	0,0

Tabel 5: **Openstaande vorderingen (in miljoen €)**

Openstaande vorderingen (in miljoen €)	openstaand per 31-12-25	ingesteld in 2025	ontvangen in 2025	openstaand per 31-12-25
Royalty's	0,0	0,0	0,0	0,0

Toelichting bij tabellen 1 t/m 5

Algemeen

Bovenstaande tabellen geven voor het project Grensverleggende IT inzicht in de gerealiseerde ontvangsten, de gerealiseerde betalingen, de aangegane en openstaande verplichtingen, de verstrekte, verrekende en de openstaande voorschotten, de ingestelde, ontvangen en openstaande vorderingen naar de stand van begin en ultimo 2025. Dit overzicht is opgesteld in overeenstemming met de vereisten voor financiële verslaggeving, zoals opgenomen in de Comptabiliteitswet en de Regeling Grote Projecten.

1. Ontvangsten

Binnen het project Grensverleggende IT zijn tot op heden geen bedragen ontvangen. Binnen het programma worden ook geen ontvangsten verwacht.

2. Betalingen

Op het project Grensverleggende IT is gedurende 2025 in totaal € 77,5 miljoen betaald. Hiervan is € 48,2 miljoen uitgegeven aan de activiteiten die zijn uitgevoerd door het consortium inzake de realisatie van de blokken.

In de Terbeschikkingstellings-fase van het project is gedurende 2025 in totaal € 174,8 miljoen betaald. De grootste kostenposten betreffen: Modules Ontplooid (BR-029; € 92,9 miljoen) Private Cloud-blokken (BR-014 t/m 017; € 21,9 miljoen), IT Toegangscontrole (BR-024; € 9,4 miljoen) en Operationele Compartimenten (BR-028; € 7,1 miljoen) en de overkoepelende werkzaamheden voor: IT control & governance (€ 11,7 miljoen) en blok-ondersteunende rollen (€ 10,8 miljoen). De bovengenoemde bedragen maken deel uit van de bedragen zoals genoemd in de voortgangsrapportage. Naast de bovengenoemde kosten worden in de voortgangsrapportage namelijk ook kosten toegewezen voor onder meer de inzet van Defensiepersoneel.

3. Verplichtingen

Gedurende 2025 zijn er met betrekking tot de realisatie van het programma Grensverleggende IT voor in totaal € 95,3 miljoen aan verplichtingen aangegaan, waaronder: Modules Ontplooid (BR-029, € 34,0 miljoen), IT control & governance € 11,4 miljoen, Regievoering € 10,2 miljoen en IT Operational Management (BR-019, € 5,5 miljoen).

In de Terbeschikkingstellings-fase van het project is gedurende 2025 voor een bedrag van € 187,9 miljoen aan contracten getekend. De grootste contracten voor GrIT-blokken in deze fase betreffen: Modules Ontplooid (BR-029, € 72,6 miljoen), Private Cloud-blokken (BR-014 t/m 017; € 30,8 miljoen), IT Toegangscontrole (BR-24; € 9,4 miljoen) en Beheerprocessen (BR-018; € 9,1 miljoen). Daarnaast zijn er contracten aangegaan voor de overkoepelende werkzaamheden: IT control & governance (€ 20,9 miljoen) en blok-ondersteunende rollen (€ 13,3 miljoen).

In de Terbeschikkingstellings-fase van het project is gedurende 2025 voor een bedrag van € 187,9 miljoen aan contracten getekend. De grootste contracten voor GrIT-blokken in deze fase betreffen: Modules Ontplooid (BR-029, € 72,6 miljoen), Private Cloud-blokken (BR-014 t/m 017; € 30,8 miljoen), IT Toegangscontrole (BR-24; € 9,4 miljoen) en Beheerprocessen (BR-018; € 9,1 miljoen). Daarnaast zijn er contracten aangegaan voor de overkoepelende werkzaamheden: IT control & governance (€ 20,9 miljoen) en blok-ondersteunende rollen (€ 13,3 miljoen).

4. Voorschotten

Binnen het project Grensverleggende IT is geen sprake van significante voorschotbetalingen. Voor de aan de bouw van de datacenters gerelateerde werkzaamheden is in 2024 een voorschot van ca. € 0,8 miljoen verstrekt, dat voorschot is in 2025 verrekend waardoor er geen openstaande voorschotten zijn per eind 2025.

5. Vorderingen

Binnen het project Grensverleggende IT worden geen ontvangsten verwacht. Daarom staat ook het saldo voor de vorderingen binnen het project op 0.

